
# ОБЗОР СМЕТЫ НА СОЗДАНИЕ САЙТА

#### ОБЗОР ЗАТРАТ ПО ЭТАПАМ

Состояние затрат для задач верхнего уровня.

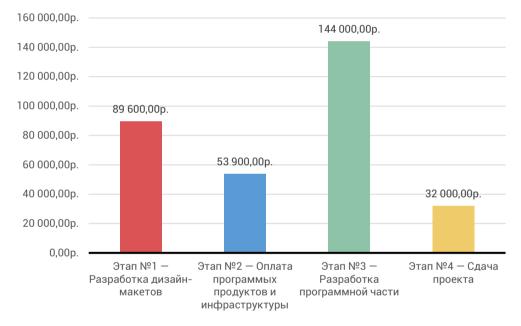

### РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ

Распределение затрат между задачами в зависимости от их состояния.

Название	Затраты	Начало	Окончание	Длительно сть
Этап №1 — Разработка дизайн-макетов	89 600,00p.	Пн 06.05.19	Cp 29.05.19	16 дней
Этап №2 — Оплата программых продуктов и инфраструктуры	53 900,00p.	Cp 29.05.19	Cp 29.05.19	0 дней
Этап №3 — Разработка программной части	144 000,00p.	Чт 30.05.19	Вт 25.06.19	18 дней
Этап №4 — Сдача проекта	32 000,00p.	Cp 26.06.19	Чт 04.07.19	7 дней

## Краткая смета

Сведения о затратах для всех задач с разбивкой на подэтапы

Название	Затраты	Начало	Окончание	Длительность	Трудозатраты
Разработка сайта	319 500,00p.	Пн 06.05.19	Чт 04.07.19	41 дней	664 ч
Этап №1 — Разработка дизайн-макетов	89 600,00p.	Пн 06.05.19	Cp 29.05.19	16 дней	224 ч
Разработка прототипа	22 400,00p.	Пн 06.05.19	Чт 16.05.19	7 дней	56 ч
Контроль выполнения работ в соответствии с техзаданием	19 200,00p.	Вт 07.05.19	Чт 16.05.19	6 дней	48 ч
Утверждение прототипа отделом маркетинга	3 200,00p.	Пт 17.05.19	Пт 17.05.19	1 день	8 ч
Разработка дизайна	22 400,00p.	Пн 20.05.19	Вт 28.05.19	6,5 дней	56 ч
Контроль выполнения работ в соответствии с техзаданием	19 200,00p.	Вт 21.05.19	Вт 28.05.19	6 дней	48 ч
Утверждение дизайна отделом маркетинга	3 200,00p.	Cp 29.05.19	Cp 29.05.19	1 день	8 ч
Этап №2 — Оплата программых продуктов и инфраструктуры	53 900,00p.	Cp 29.05.19	Cp 29.05.19	0 дней	0 ч
Приобритение платформы управления "1С-Битрикс: Управление сайтом - Малый бизнес"	35 900,00p.			0 дней	0 ч
Оплата годовой аренды выделенного сервера	18 000,00p.			0 дней	0 ч
Этап №3 — Разработка программной части	144 000,00p.	Чт 30.05.19	Вт 25.06.19	18 дней	360 ч
Адаптивная верстка дизайн-макета	25 600,00p.	Чт 30.05.19	Вт 04.06.19	4 дней	64 ч
Интеграция с системой управления	60 800,00p.	Cp 05.06.19	Чт 20.06.19	11 дней	152 ч
Загрузка на тестовый сервер	3 200,00p.	Пт 21.06.19	Пт 21.06.19	1 день	8 ч
Контроль выполнения работ в соответствии с техзаданием	48 000,00p.	Пт 31.05.19	Пт 21.06.19	15 дней	120 ч
Тестирование	3 200,00p.	Пн 24.06.19	Пн 24.06.19	1 день	8 ч
Утверждение функционала руководителем организации и отделом маркетинга	3 200,00p.	Вт 25.06.19	Вт 25.06.19	1 день	8 ч
STOR NOA — CROUD RECONTS	32 000 00p	Cn 26 06 10	U+ 04 07 10	7 пцей	80 u

отапту-ч одача проекта	32 000,00p.	ор 20.00.13	11 04.01.13	т дней	00 4
Загрузка на хостинг	3 200,00p.	Cp 26.06.19	Cp 26.06.19	1 день	8 ч
Установка SSL сертификатов	3 200,00p.	Cp 26.06.19	Cp 26.06.19	1 день	8 ч
Интеграция с 1С-предприятие	19 200,00p.	Чт 27.06.19	Вт 02.07.19	4 дней	48 ч
Тестирование	3 200,00p.	Cp 03.07.19	Cp 03.07.19	1 день	8 ч
Утверждение работы функционала руководителем организации и отделом снабжения	3 200,00p.	Чт 04.07.19	Чт 04.07.19	1 день	8 ч

## Полная смета проекта

Название	Затраты	Начало	Окончание	Длительность	Трудозатраты
Разработка сайта	319 500,00p.	Пн 06.05.19	Чт 04.07.19	41 дней	664 ч
Этап №1 — Разработка дизайн-макетов	89 600,00p.	Пн 06.05.19	Cp 29.05.19	16 дней	224 ч
Разработка прототипа	22 400,00p.	Пн 06.05.19	Чт 16.05.19	7 дней	56 ч
Структура сайта	3 200,00p.	Пн 06.05.19	Пн 06.05.19	1 день	8 ч
Навигации	3 200,00p.	Вт 07.05.19	Вт 07.05.19	1 день	8 ч
Главная и внутренние страницы	3 200,00p.	Cp 08.05.19	Cp 08.05.19	1 день	8 ч
Прототипирование блоков: Новости, Товары, Услуги, Оплата и доставка, О компании, Справочник, Контакты, Партнеры, Личный кабинет пользователя	12 800,00p.	Пн 13.05.19	Чт 16.05.19	4 дней	32 ч
Контроль выполнения работ в соответствии с техзаданием	19 200,00p.	Вт 07.05.19	Чт 16.05.19	6 дней	48 ч
Утверждение прототипа отделом маркетинга	3 200,00p.	Пт 17.05.19	Пт 17.05.19	1 день	8 ч
Разработка дизайна	22 400,00p.	Пн 20.05.19	Вт 28.05.19	6,5 дней	56 ч
Дизайн макета «Главная»	3 200,00p.	Пн 20.05.19	Пн 20.05.19	1 день	8 ч
Дизайн макета «Список разделов каталога»	3 200,00p.	Вт 21.05.19	Вт 21.05.19	1 день	8 ч
Дизайн макета «Товары»	1 600,00p.	Cp 22.05.19	Cp 22.05.19	0,5 дней	4 ч
п У	1 600 00	0 00 05 10	0 00 0F 10	^ F v	

дизаин макета «услуги»	т бий,ийр.	Cp 22.05.19	Cp 22.05.19	0,5 днеи	4 4
Дизайн макета «Новости»	1 600,00p.	Чт 23.05.19	Чт 23.05.19	0,5 дней	4 ч
Дизайн макета «Личный кабинет клиента»	1 600,00p.	Чт 23.05.19	Чт 23.05.19	0,5 дней	4 ч
Дизайн макета «Оплата и доставка»	1 600,00p.	Пт 24.05.19	Пт 24.05.19	0,5 дней	4 ч
Дизайн макета «Партнеры»	1 600,00p.	Пт 24.05.19	Пт 24.05.19	0,5 дней	4 ч
Дизайн макета «Отзывы»	1 600,00p.	Пн 27.05.19	Пн 27.05.19	0,5 дней	4 ч
Дизайн макета «О компании»	1 600,00p.	Пн 27.05.19	Пн 27.05.19	0,5 дней	4 ч
Дизайн макета «Справочник»	1 600,00p.	Вт 28.05.19	Вт 28.05.19	0,5 дней	4 ч
Дизайн макета «Контакты»	1 600,00p.	Вт 28.05.19	Вт 28.05.19	0,5 дней	4 ч
Контроль выполнения работ в соответствии с техзаданием	19 200,00p.	Вт 21.05.19	Вт 28.05.19	6 дней	48 ч
Утверждение дизайна отделом маркетинга	3 200,00p.	Cp 29.05.19	Cp 29.05.19	1 день	8 ч
Этап №2 — Оплата программых продуктов и инфраструктуры	53 900,00p.	Cp 29.05.19	Cp 29.05.19	0 дней	0 ч
Приобритение платформы управления "1С-Битрикс: Управление сайтом - Малый бизнес"	35 900,00p.			0 дней	0 ч
Оплата годовой аренды выделенного сервера	18 000,00p.			0 дней	0 ч
Этап №3 — Разработка программной части	144 000,00p.	Чт 30.05.19	Вт 25.06.19	18 дней	360 ч
Адаптивная верстка дизайн-макета	25 600,00p.	Чт 30.05.19	Вт 04.06.19	4 дней	64 ч
Интеграция с системой управления	60 800,00p.	Cp 05.06.19	Чт 20.06.19	11 дней	152 ч
Установка ядра платформы ("1С-Битрикс: Управление сайтом". Лицензия Малый бизнес)	6 400,00p.	Cp 05.06.19	Чт 06.06.19	2 дней	16 ч
Создание и подключение базы данных	25 600,00p.	Пт 07.06.19	Чт 13.06.19	4 дней	64 ч
Подключение верстки к c <b>ms (Битрикс)</b>	25 600,00p.	Пт 14.06.19	Cp 19.06.19	4 дней	64 ч
Подключение модуля обратного звонка	3 200,00p.	Чт 20.06.19	Чт 20.06.19	1 день	8 ч
Загрузка на тестовый сервер	3 200,00p.	Пт 21.06.19	Пт 21.06.19	1 день	8 ч
Контроль выполнения работ в соответствии с техзаданием	48 000,00p.	Пт 31.05.19	Пт 21.06.19	15 дней	120 ч

Тестирование	3 200,00p.	Пн 24.06.19	Пн 24.06.19	1 день	8 ч
Утверждение функционала руководителем организации и отделом маркетинга	3 200,00p.	Вт 25.06.19	Вт 25.06.19	1 день	8 ч
Этап №4 — Сдача проекта	32 000,00p.	Cp 26.06.19	Чт 04.07.19	7 дней	80 ч
Загрузка на хостинг	3 200,00p.	Cp 26.06.19	Cp 26.06.19	1 день	8 ч
Установка SSL сертификатов	3 200,00p.	Cp 26.06.19	Cp 26.06.19	1 день	8 ч
Интеграция с 1С-предприятие	19 200,00p.	Чт 27.06.19	Вт 02.07.19	4 дней	48 ч
Настройка сервера 1С	6 400,00p.	Чт 27.06.19	Пт 28.06.19	2 дней	16 ч
Настройка веб-сервера	12 800,00p.	Пн 01.07.19	Вт 02.07.19	2 дней	32 ч
Тестирование	3 200,00p.	Cp 03.07.19	Cp 03.07.19	1 день	8 ч
Утверждение работы функционала руководителем организации и отделом снабжения	3 200,00p.	Чт 04.07.19	Чт 04.07.19	1 день	8 ч
